

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 66/bud/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Broekstraat 50
3620 Lanaken

EIGENAAR: De Macker
Adres: Broekstraat 50 3620 Lanaken

OPDRACHTGEVER: ETL
Adres: Broekstraat 10 3620 Lanaken

INSTALLATEUR: idem
Adres: _____

BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 6/11/06 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 268) (T.B. art. 234) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortspijg - Verzwaring : Type der lokalen: appartement 5.2b

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1183 AREI art. 85

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40
Bedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type stif 20A 125A

Type van de aardelektrode: lus - barek - penne - horizontale geleider Schema: TT _____
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 2 Ohm; RI tot >10 MOhm

BESCHRIJVING: zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of notes: Geen

Nota: * bad + badmeubel is nog te plaatsen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.


BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de fendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/11/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder verdrag wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

GG Walleb
Walleb

De directeur,

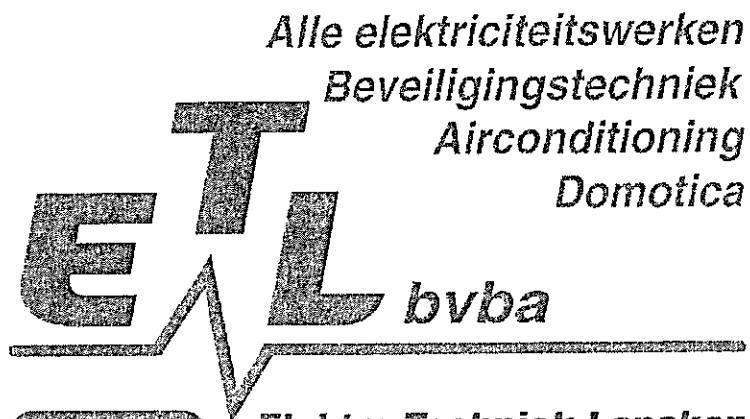

Elektro Techniek Lanaken

Broekstraat 10 • 3620 Lanaken
Tel. 089-71 53 09 • Fax 089-71 82 48
ETL_bvba@telenet.be

11 / 06 / 2006

ELEKTRISCH DOSSIER

DE MACKER
BROEKSTRAAT 50 BUS 5
BE-3620 LANAKEN

INHOUD:

- # eendraadsschema algemeen
 - # gelijkvloers
 - # kringverdeling
- s.l.b.

Keuringsorganisme:


BTV:

66 BTU
~~66 BTU~~
0/1/06

Verdeling van de kringen

A	32A	ELEKTRISCH VUUR
B	20A	VAATWAS
C	20A	WASMACHINE
D	20A	DROOGKAST
E	20A	STOPCONTACTEN KEUKEN
F	20A	STOPCONTACTEN LIVING + EETKAMER + TERRAS ACHTER
G	20A	STOPCONTACTEN SLK 1 + SLK 2
H	20A	STOPCONTACTEN BERGING + CV + BADKAMER + TERRAS VOOR
I	20A	GARAGE
J	16A	VOEDING LUXOM
K	16A	VERLICHTING KRING 1
L	16A	VERLICHTING KRING 2

GGTV
~~GGTV~~
Glasco

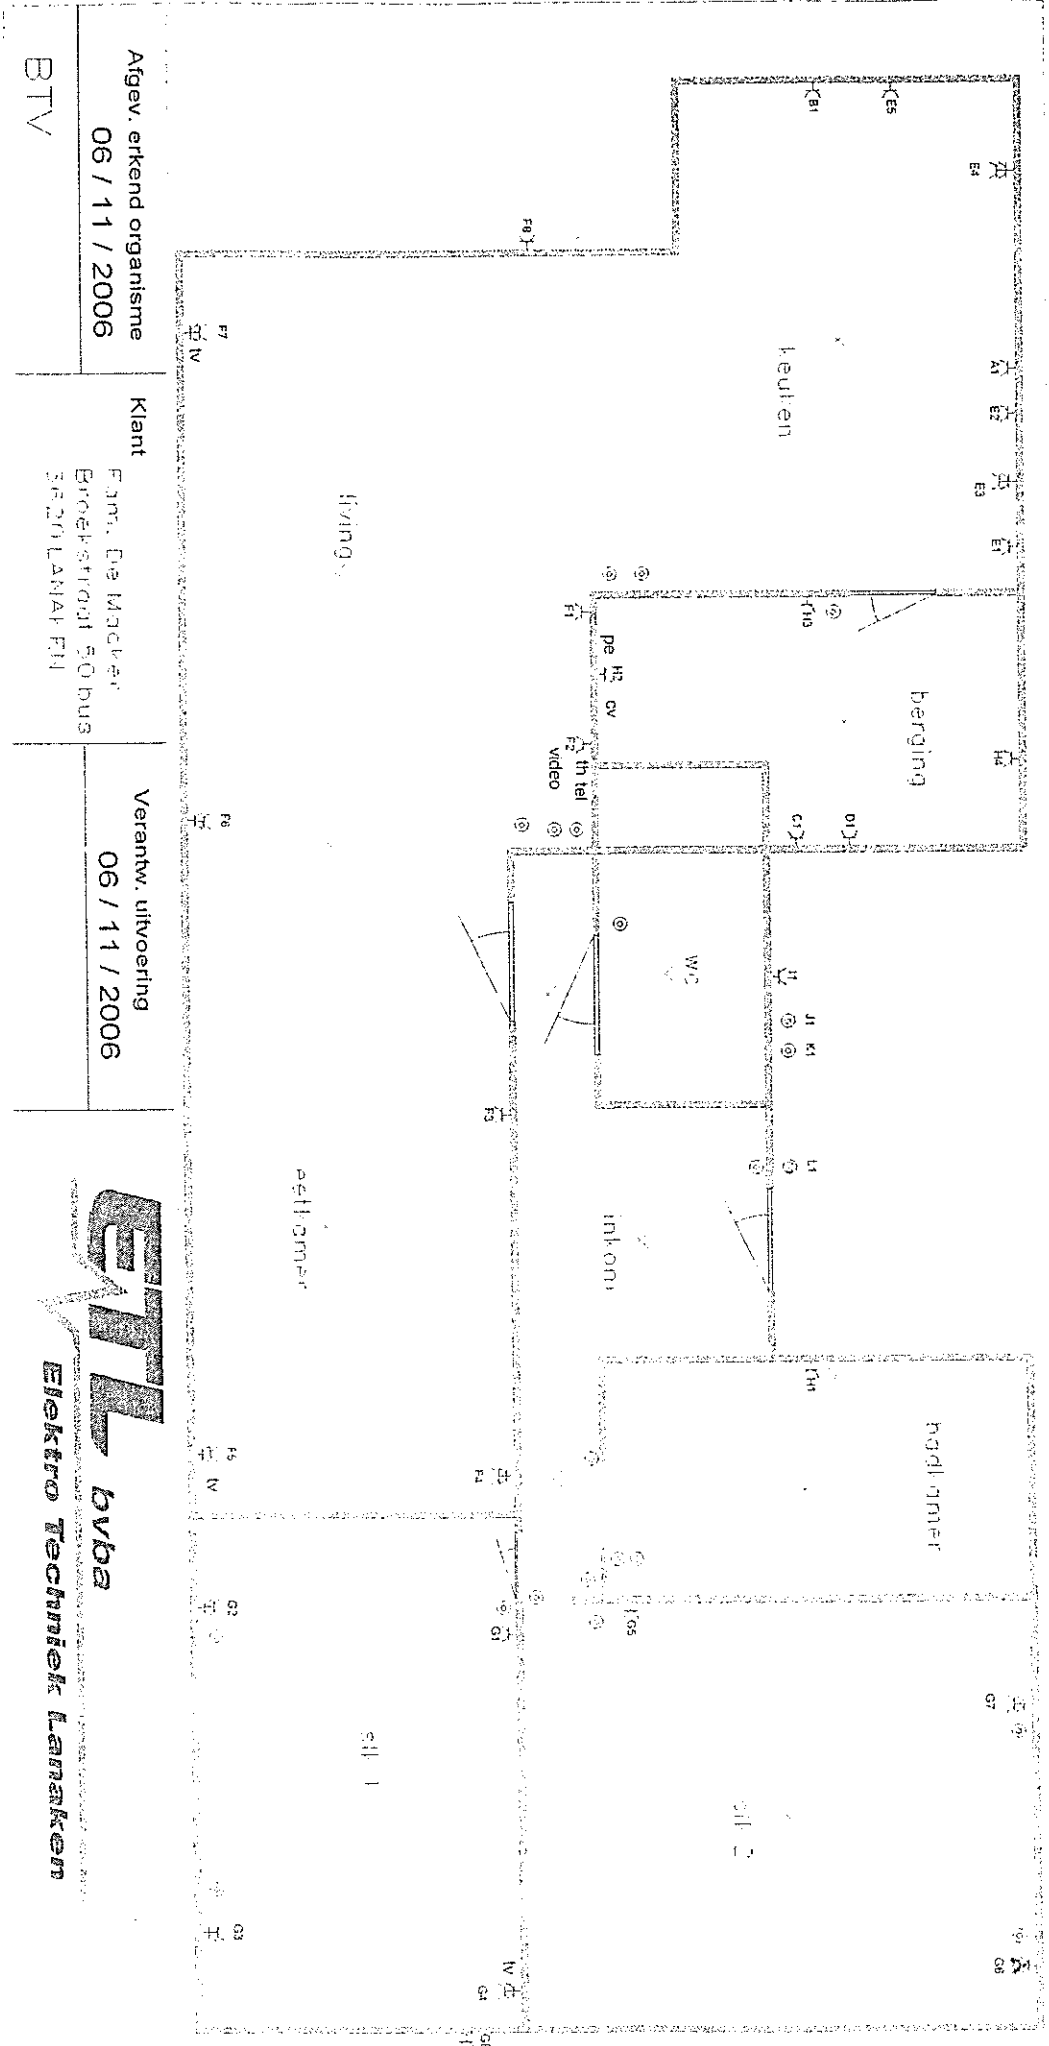

Afgev. erkend organisme
06 / 11 / 2006

Klant
Fam. De Maeker
Broekstraat 50 bus
3620 LANAI RN

Verantw. uitvoering
06 / 11 / 2006

BTTL bvba
Elektro Techniek Lanaken

60 BTU
V. De Maeker
06/11/06

BTV




Afgeve. erkend organisme
06 / 11 / 2006

Klant

Fam. De Macker
Broekstraat 50 bus
3620 LANAKEN

Verantw. uitvoering

06 / 11 / 2006

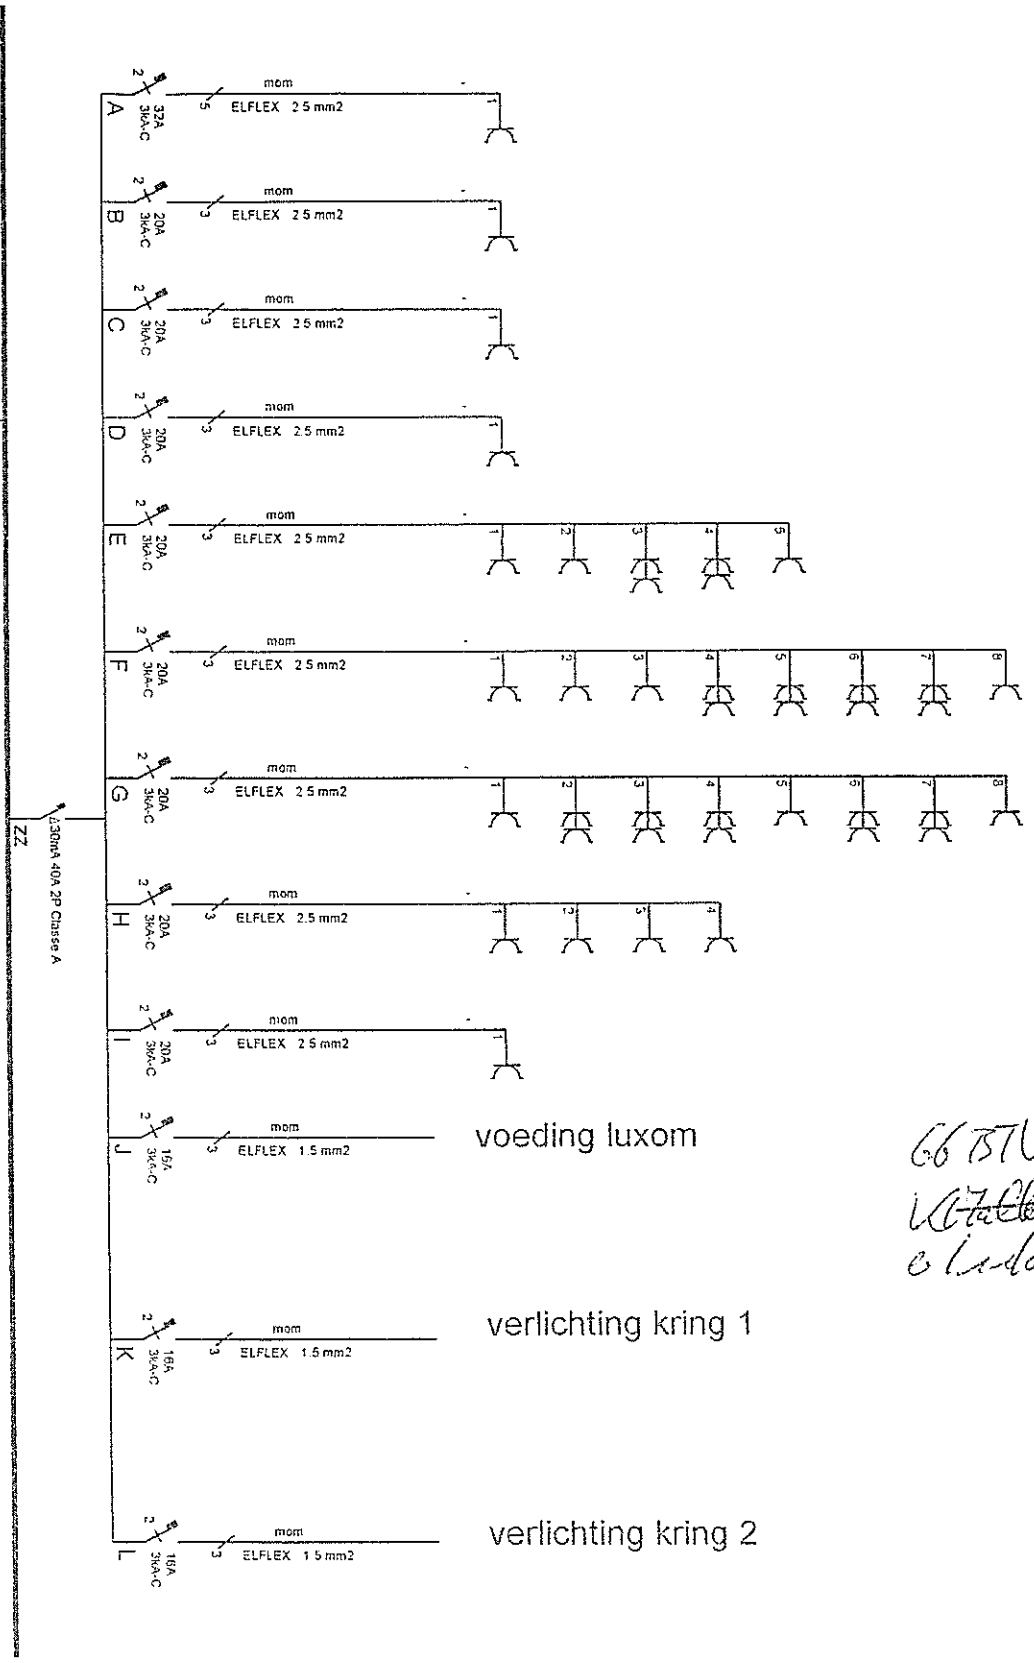

voeding luxom

verlichting kring 1

verlichting kring 2

66 BTU
[Handwritten signature]
06/11/06
